



Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: kv1231	fra Hp/km: hp1 m249	til Hp/km:
Strekning: Sæbøvik - Tofte	Sted: Nedre Sæbø	
Arbeid som skal utføres: Lage veg opp til fyllingsfot i "Nillesvingen" for grunnundersøkelser.		
Ansvarshavende: Ronny Sjo	Tlf./e-post: 92087349/ronny@stordanlegg.no	
Entreprenør: Thormodseter entreprenør AS	Adresse: Strondavegen, 5454 Sæbøvik	

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato: 12 april 2018	Til dato: 30 april 2018	E-post: post.te@outlook.com
-------------------------	-------------------------	-----------------------------

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:			
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Gående langs den smale veggen	2	2	4
2: Kjørende langs smal veg.	2	2	4
3: Muleg Ustabil fylling i nillesvingen	2	2	4
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Maskinfører må følge med på mjuke trafikanter når lastebil tipper masser/Rygger
- 2: Bruke roterende varsellys for å gjere biler oppmerksame.
- 3: Unngå å fjerne stein/grave groper som kan påvirke eksisterende fylling.

4: _____

5: _____

6: _____

7: _____


8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

Merknader:





Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: kv1231	fra Hp/km: hp1 m249	til Hp/km: 0
Strekning: Sæbøvik - Tofte		Sted: Nedre Sæbø
Arbeid som skal utføres:	Lage veg opp til fyllingsfot i "Nillesvingen" for grunnundersøkelser.	
Entreprenør:	Thormodseter entreprenør AS	
Adresse:	Strondavegen, 5454 Sæbøvik	
Ansvarshavende:	Ronny Sjo	Tlf./e-post: 92087349/ronny@stordanlegg.no
Stedsansvarlig(e):	Edmund Thormodseter	Tlf./e-post: 90690272
Arbeidet utføres	fra dato: 12 april 2018	Til dato: 30 april 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:



	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906VH	Etter behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:

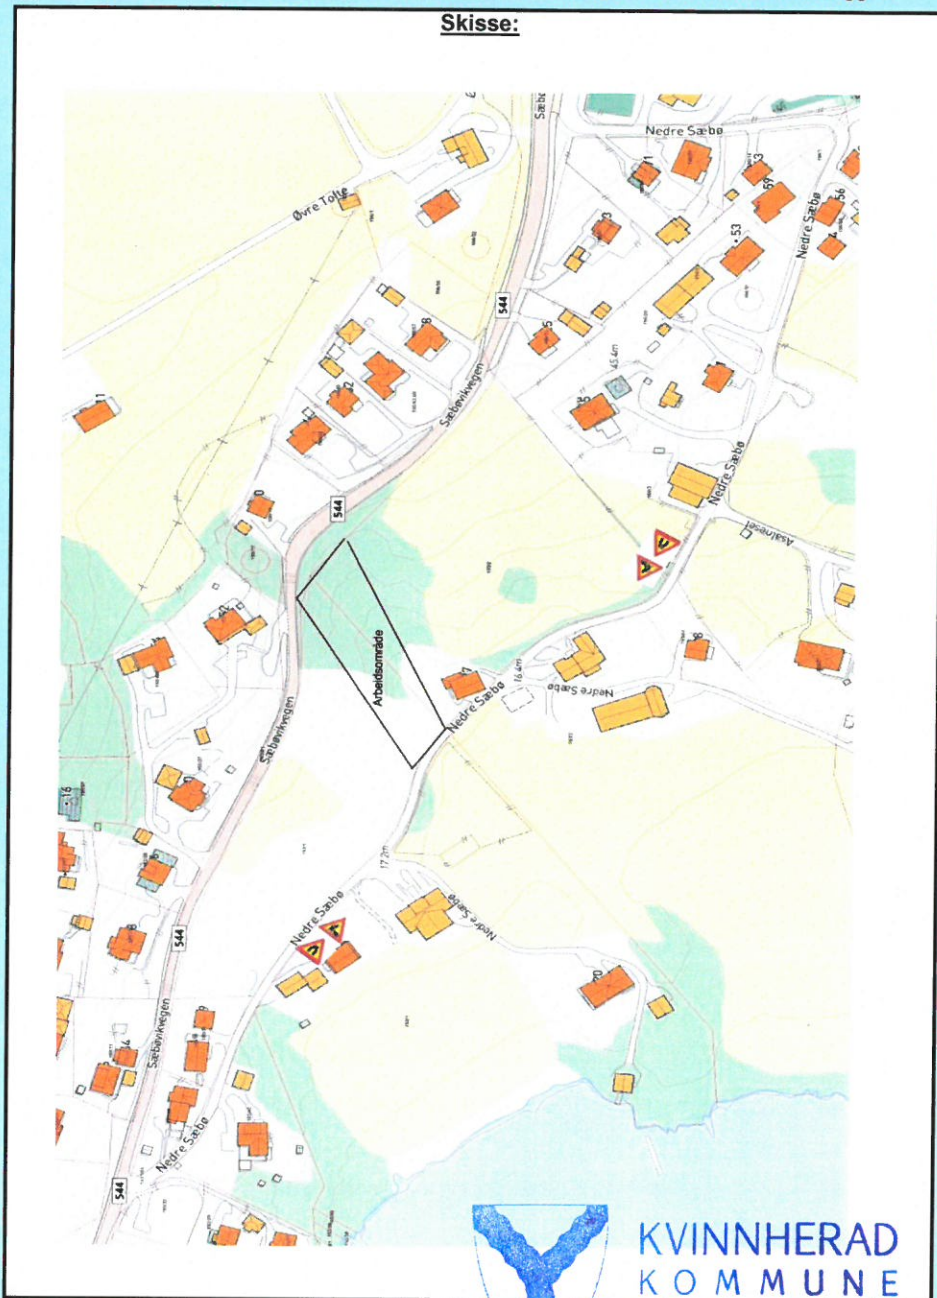

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Husnes

18.04.2018

Sted

Dato

Ejerski Lønning
Sign. (etter fullmakt)



KVINNHERAD
KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: kv1231	fra Hp/km: hp1 m249	til Hp/km: 0
Strekning: Sæbøvik - Tofte	Sted: Nedre Sæbø	
Arbeid som skal utføres: Lage veg opp til fyllingsfot i "Nillesvingen" for grunnundersøkelser.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 12 april 2018	Til dato: 30 april 2018	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ⇒ Thormodseter entreprenør AS
- Ansvarshavende: Ronny Sjo Tlf./e-post: 92087349/ronny@stordanlegg.no
Stedsansvarlig(e): Edmund Thormodseter Tlf./e-post: 90690272
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
Vegtrafikksentralen.....
Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0

00.01.1900

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: **kv1231** fra Hp/km: **hp1 m249** til Hp/km: **0**

Strekning: **Sæbøvik - Tofte** Sted: **Nedre Sæbø**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Thormodseter entreprenør AS**

Ansvarshavende: **Ronny Sjo**

Stedsansvarlig: **Edmund Thormodseter**

Kontroll utført dato: _____ Kontroll utført av: _____

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 280px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



KVINNHHERAD
KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	kv1231	fra Hp/km:	hp1 m249	til Hp/km:	0
Strekning:	Sæbøvik - Tofte			Sted:	Nedre Sæbø
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Thormodseter entreprenør AS				
Ansvarshavende:	Ronny Sjo				
Stedsansvarlig:	Edmund Thormodseter				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



KVINNHERAD
KOMMUNE

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: kv1231	fra Hp/km: hp1 m249	til Hp/km: 0
Strekning: Sæbøvik - Tofte		Sted: Nedre Sæbø

Arbeid som skal utføres: **Lage veg opp til fyllingsfot i "Nillesvingen" for grunnundersøkelser.**

Lage veg for borrhgg Norconsult for grunnundersøkelser i forbindelse med opprusting av fv 544 tofte - Sæbøvik.
